

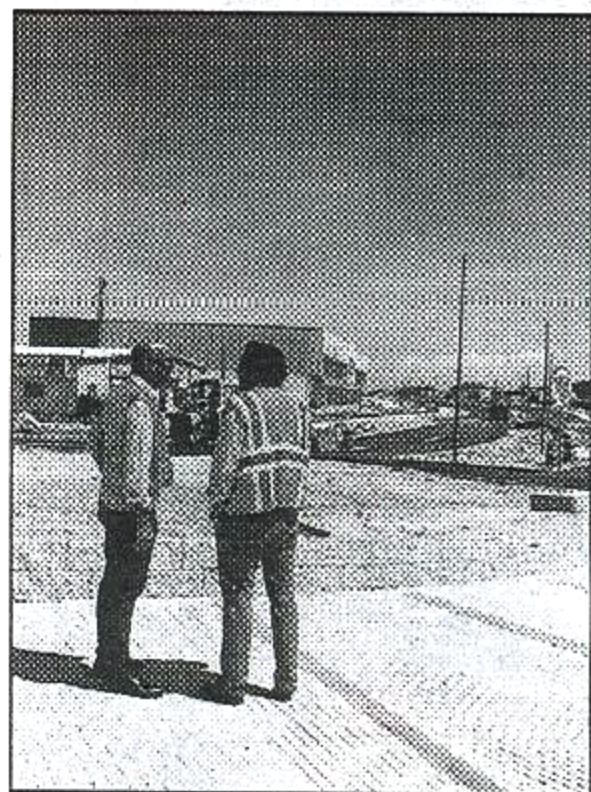


Minister Oduber ta muestra cu Proyecto Watty Vos lo keda full cla prome cu fin di aña

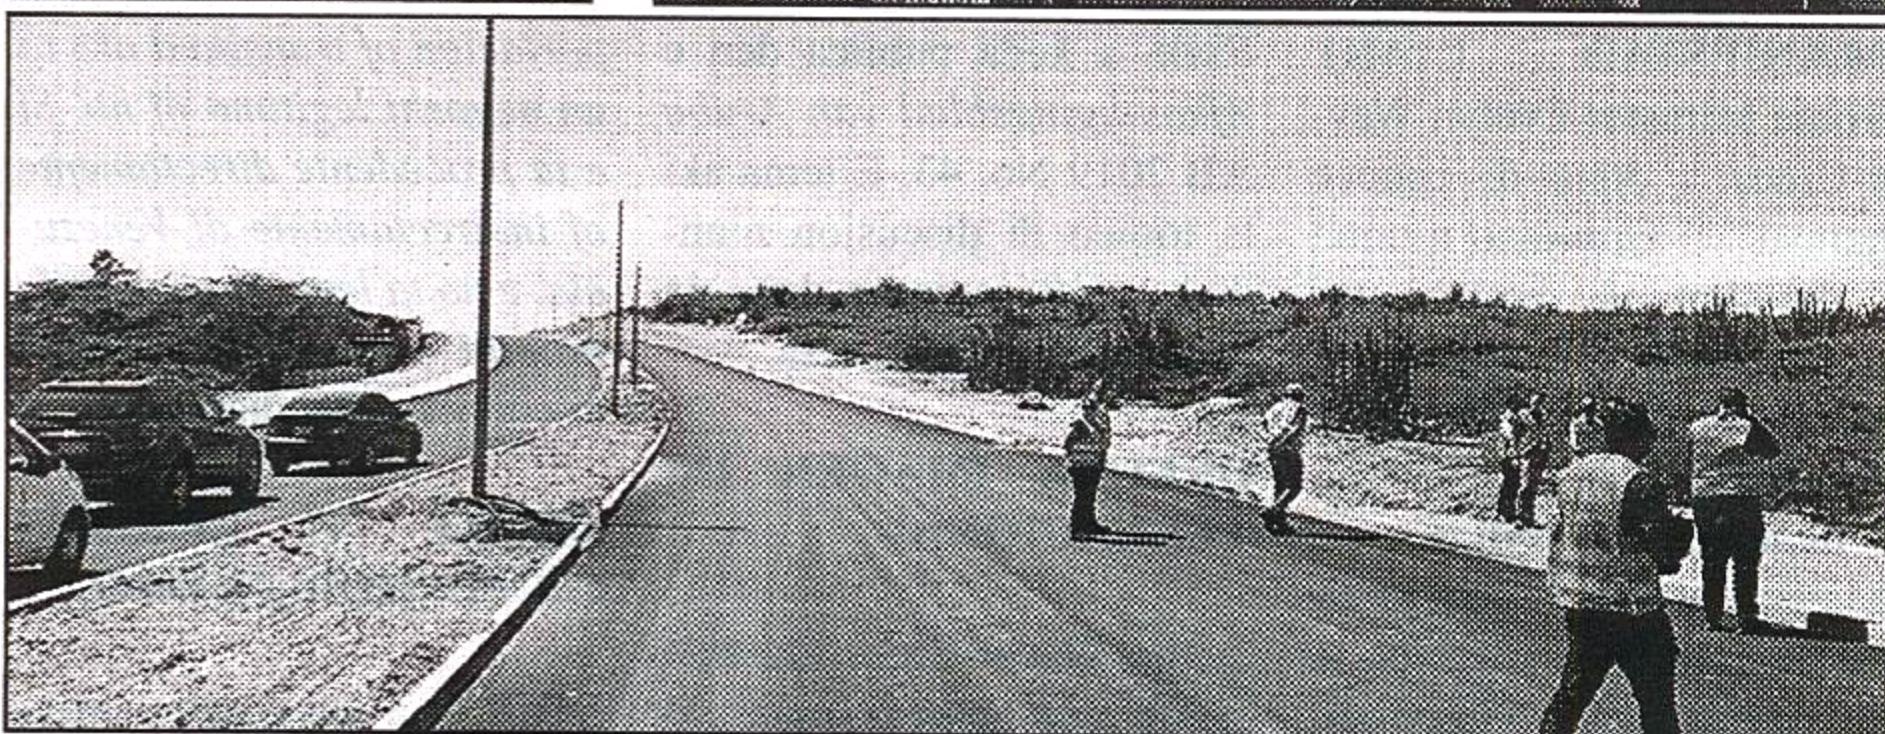

cu comunidad por spera ta cu dentro di tres luna lo mira cu lo habri mas y mas caminda, acelerando e trafico drasticamente y calmando e trafico di den centro di ciudad.

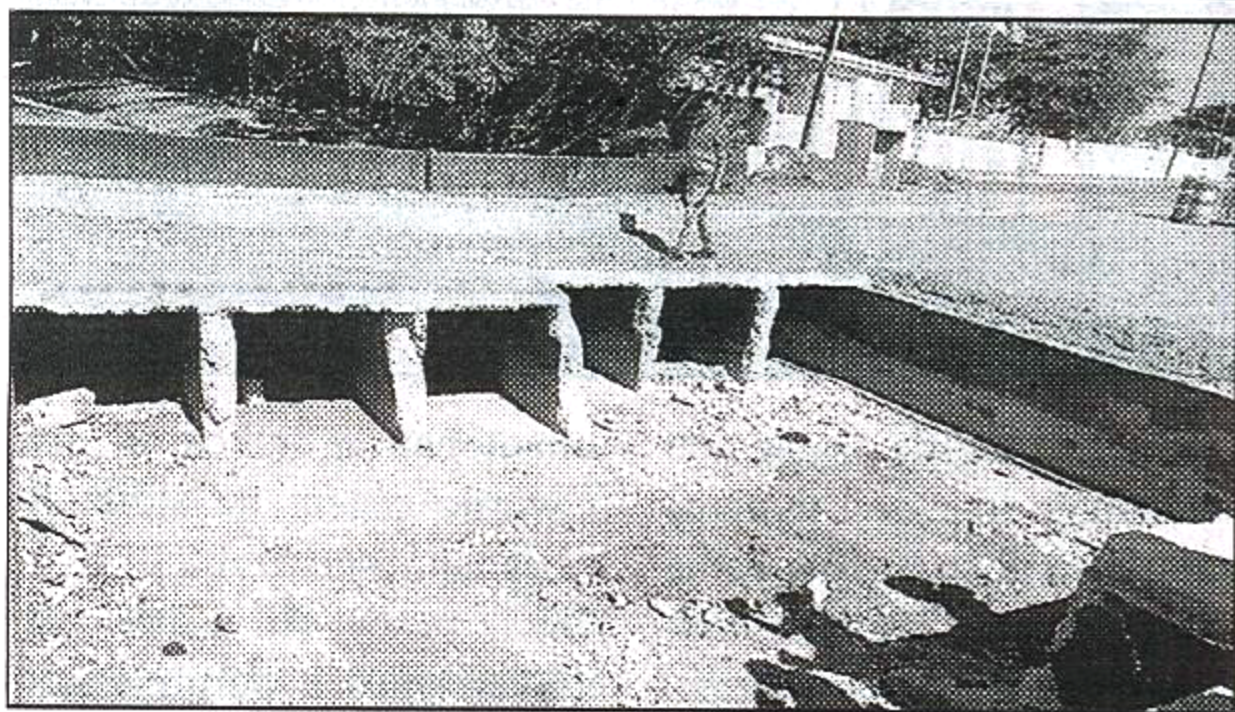

ORANJESTAD (AAN): Dentro di e proximo tres lunanan camindanan en conexion cu Watty Vos Blvd lo keda habri.

Diamars atardi miembronan di prensa a ricibi un recorrido conhuntamente cu Minister encarga cu Infraestructura Otmar Oduber riba henter e proyecto di Watty Vos Boulevard (WVB), pa cual nan a ricibi splicacion di Director di DOW Marlon Croes di e trabaonan cu a tuma luga y tambe informacion di con leu e trabaonan ta. Pa cual ta premira cu dentro di 3 luna e proyecto lo finalisa.

Minister Otmar Oduber a splica manera treci dilanti na numeroso ocasion cu WVB ta un proyecto PPP. Esaki ta significa cu unabes cu e proyecto wordo finalisa, e lo keda wordo manteni tambe door di e grupo. E mandario a duna di conoce cu na diferente momento a tuma mas tempo den e proyecto pa percura pa tin un bon producto pa cual hopi tabatin di haber cu e problema di awa cu tabatin den diferente bario rond di Aruba, pa cual a percura pa inversionnan adicional tuma luga. A percura pa e adaptacionnan necesario pa por atende cu e problemanan aki, pa na final di dia ta mas

sigur cu lo tin un proyecto di bon calidad pa futuro.

E presion cu a pone di parti DOW riba e control y ehecucion di e proyecto ta conduci cu tin un proyecto, (si compare cu Green Corridor cu a costa un aña y mey adicional prome cu e finalisa), cual ta premira cu e lo tuma solamente 3 luna adicional. Pues ta spera cu October lo por haci henter e caminda accesibel cual ta significa cu pa December, prome cu dianan di fiesta y high season pa turismo, cu e proyecto lo ta completamente entrega cu tur detaye y landscaping.

Acerca di esaki Minister Oduber a bisa: 'Na comunidad di Aruba cu hopi bes a pidi pa carga pasenshi cu e camindanan cera, poco poco por mira cu ta yegando na e punto cu e camindanan lo ta accesibel un bes mas.'

Pa conclui, Mescos cu a siña for di Green Corridor, Gobierno ta reconoce cu tin hopi cos pa siña di e proyecto aki tambe. Segun Minister Oduber e extra presion cu a pone riba control di e trabaonan a percura pa e contratista ta hopi mas 'up to par' cu e condicionnan di Gobierno y cumplimento cu contract. Pues, 'locual
